

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/02/2019

Inspecteur: Yves Pelgrims

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 1779013

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Eduard Anseelestraat
Huisnummer: 129
Postcode: 2830
Gemeente: Willebroek
Type: woning

Eigenaar:

Naam: Steven Delnooz
Straatnaam: Eduard Anseelestraat
Huisnummer: 129
Postcode: 2830
Gemeente: Willebroek

EAN : 54

Teller Nr.: 3123433

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 23

Isolatie: 59,3 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 15,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHEMAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	23	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen: Curve: Bescherming IN (A) (andere): P Sectie (mm²)

Zie schema

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw ☐

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 13/2/2044
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Yves Pelgrims

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directe energie, afsluiting gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controloorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/2/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

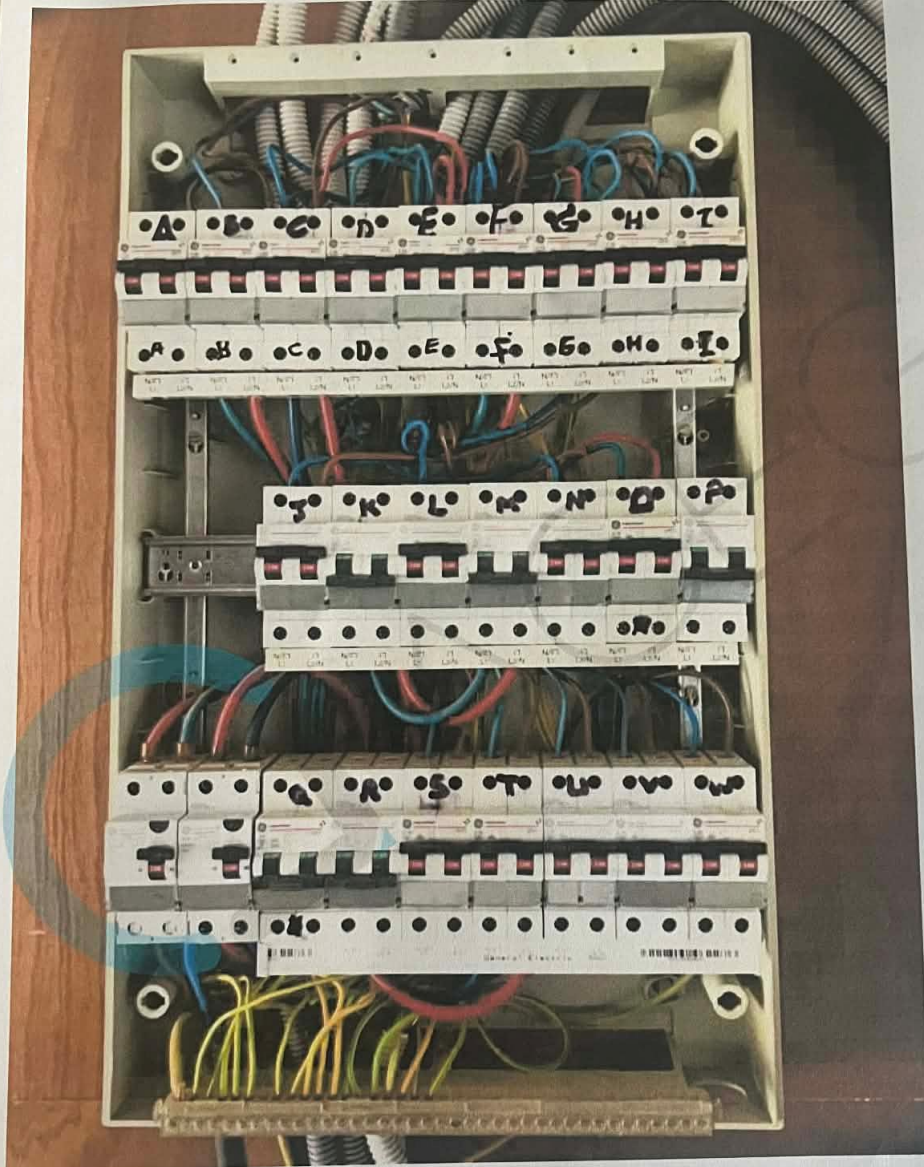

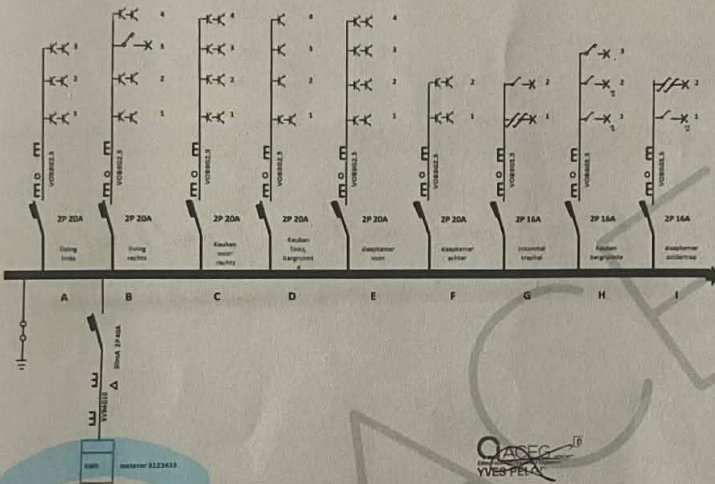

Adres van de werkgroep

10

datum

Results

Future

Journal of American Studies 32 (1998), 1, 219


[illegible]


Abstract


www.keatingcorporate.com


and February


Latency

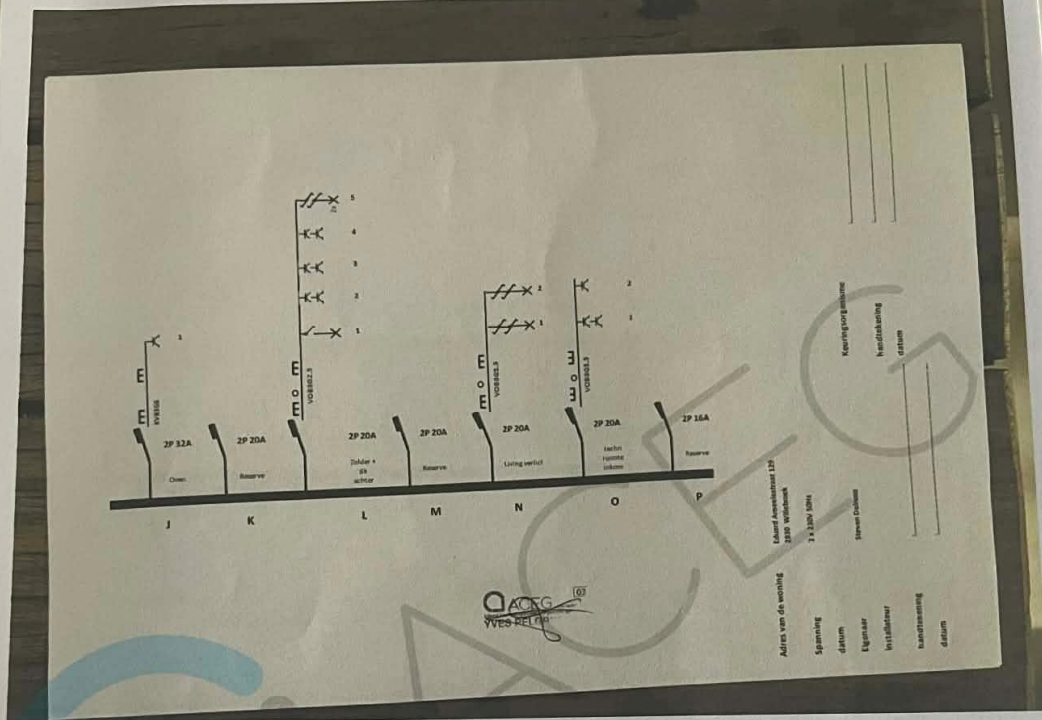


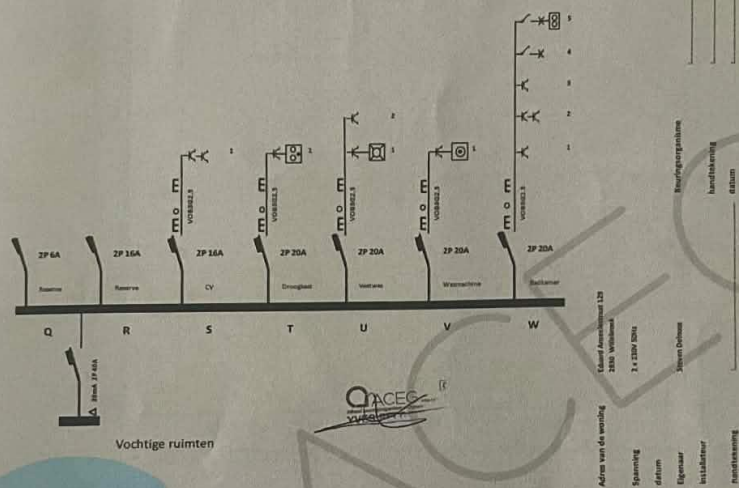


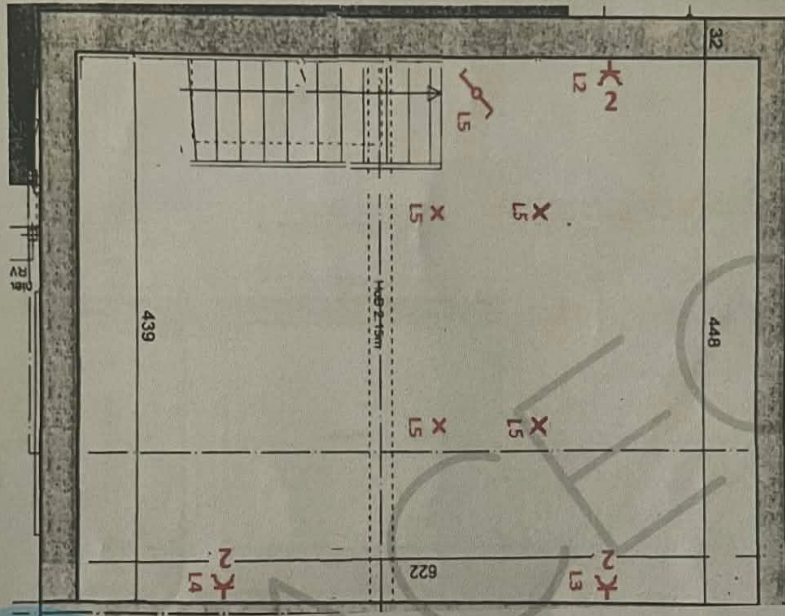

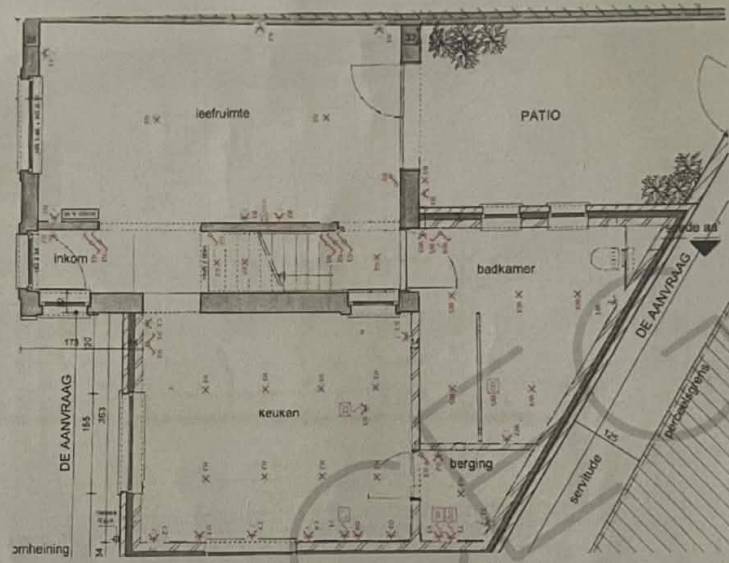


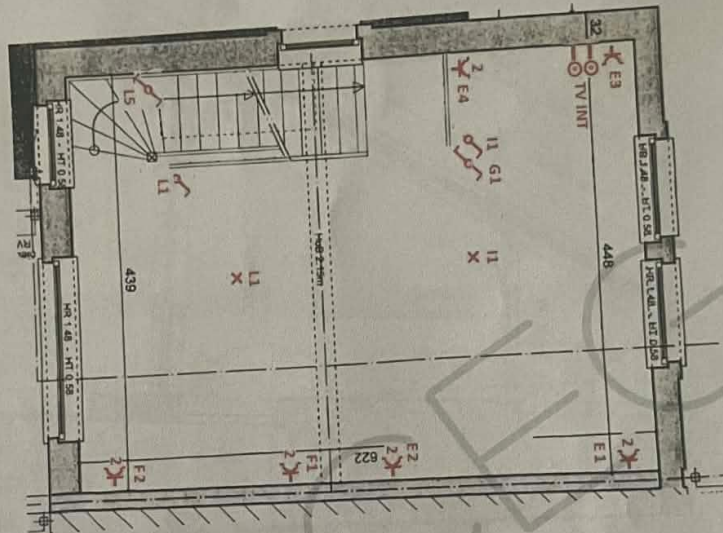


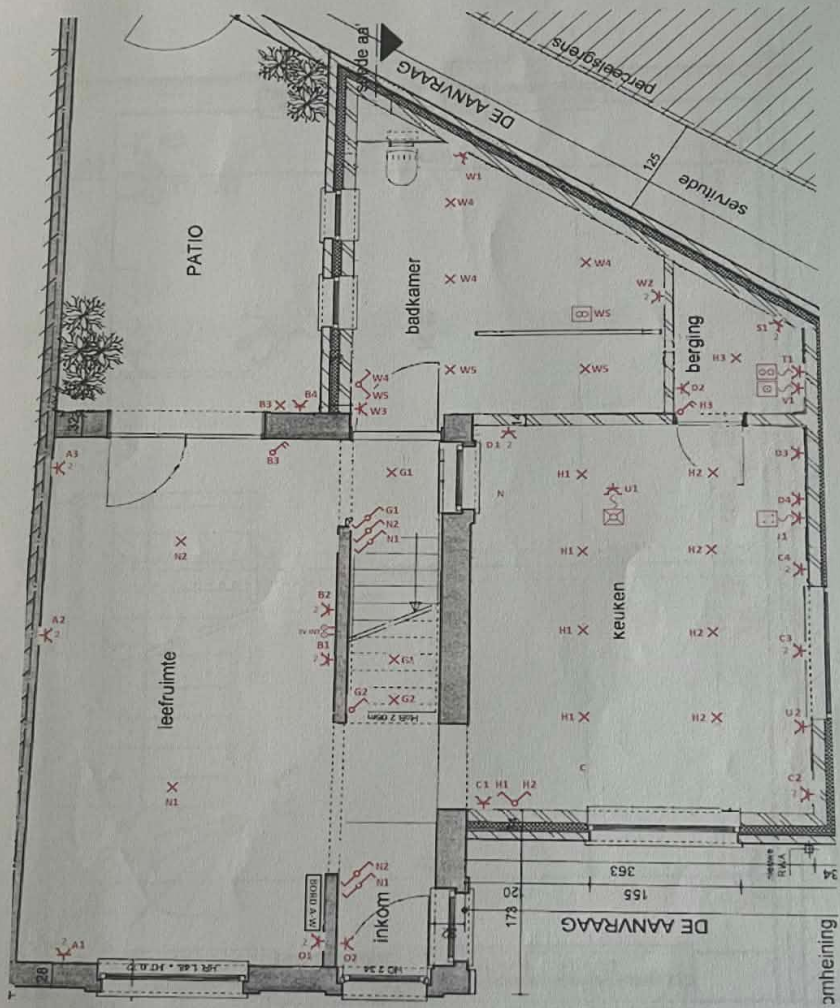




 Oude Westland

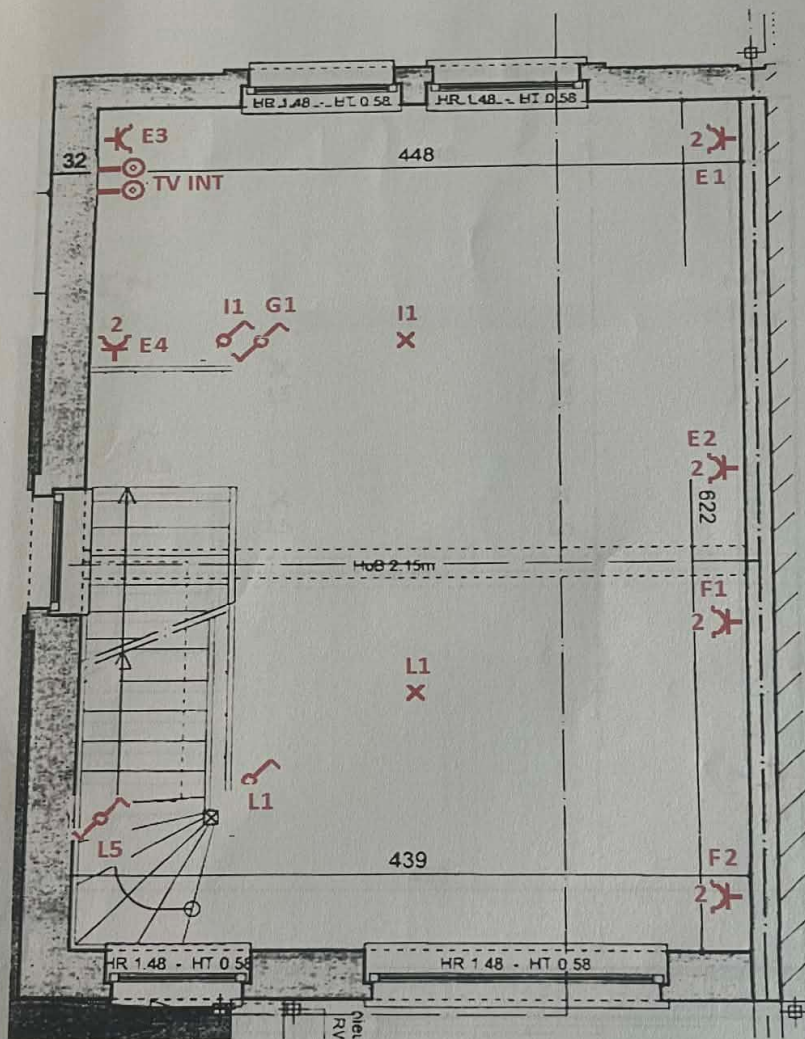


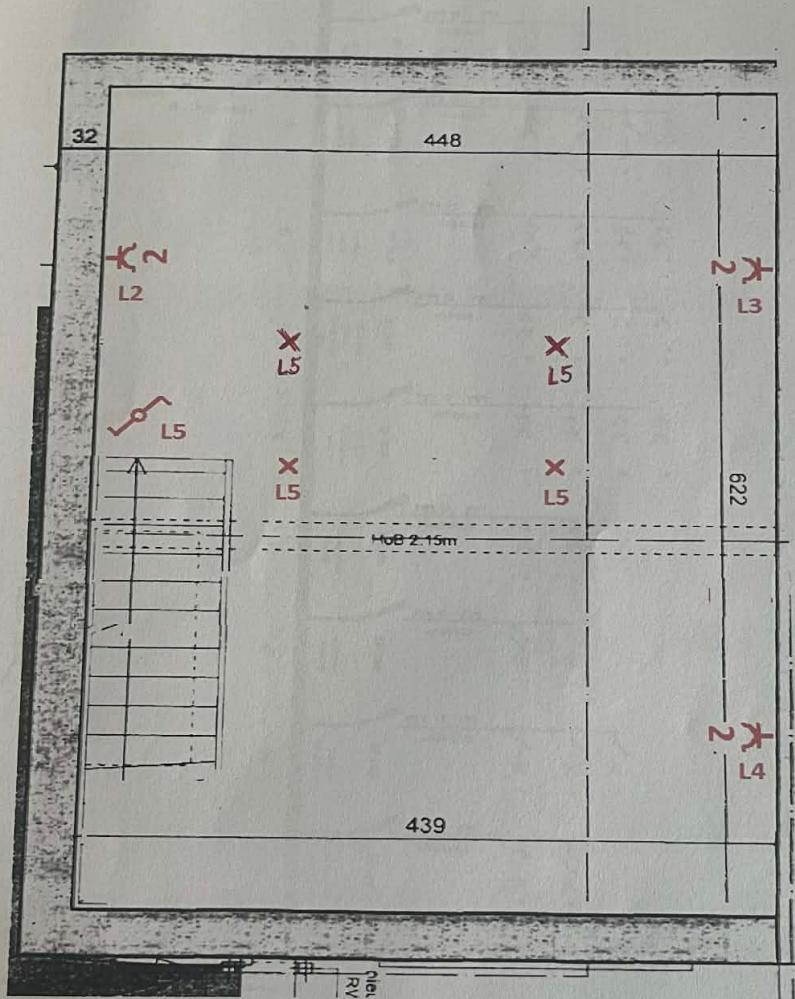

103
 AREG
 LES PAYSANS
 LES PAYSANS

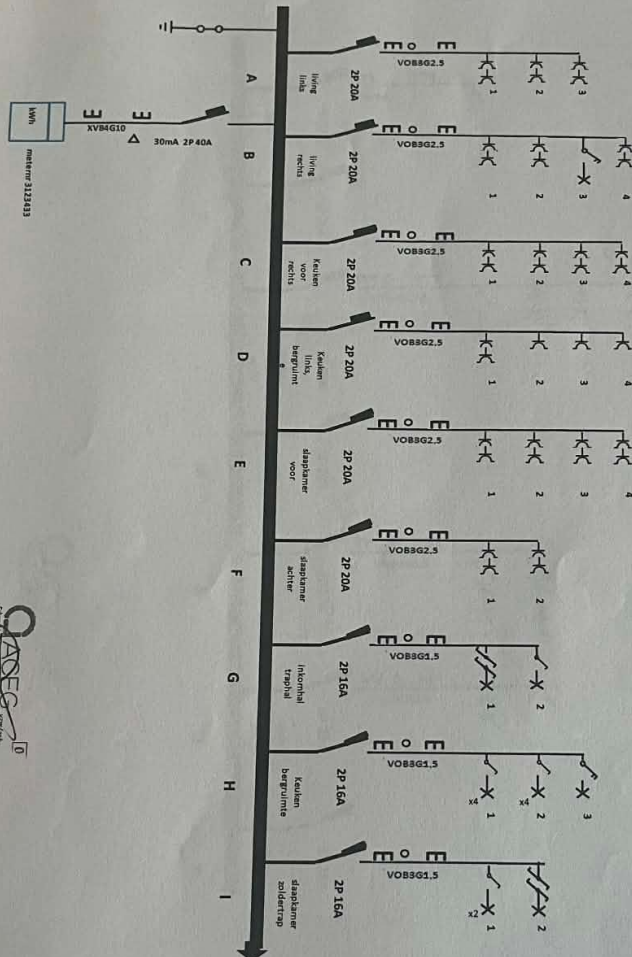

Adres van de woning	Eduard Anselestraat 129 2830 Willebroek	Keuringsorganisme	
Spanning	2 x 230V 50Hz	handtekening	
datum		datum	
Eigenaar	Steven Delhooz		
Installateur			
handtekening			
datum			

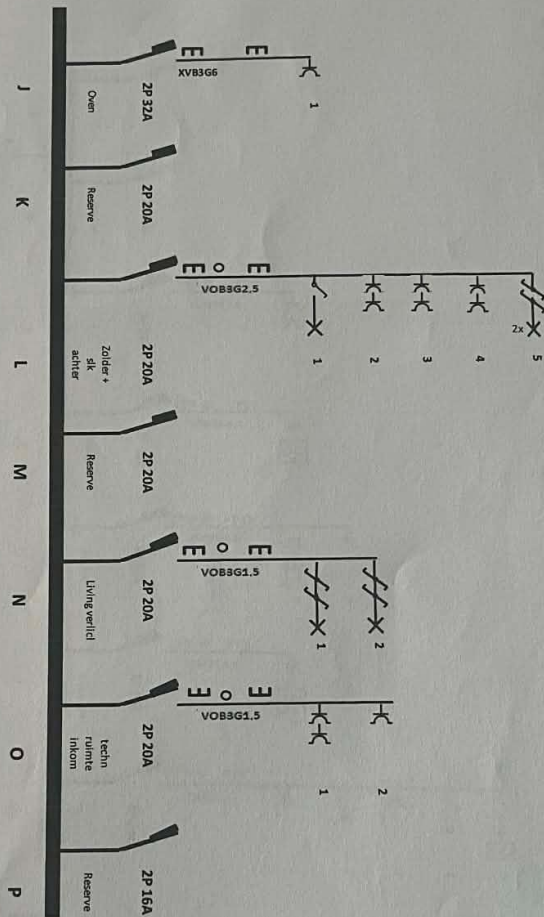

QACOG
 103
 VES-RE-103

Adres van de woning Eduard Anselestraat 129
 2830 Willebroek

Spanning 2 x 230V 50Hz

datum

Eigenaar Steven Delnooz

installateur


Keuringsorganisme

handtekening

handtekening

datum

datum

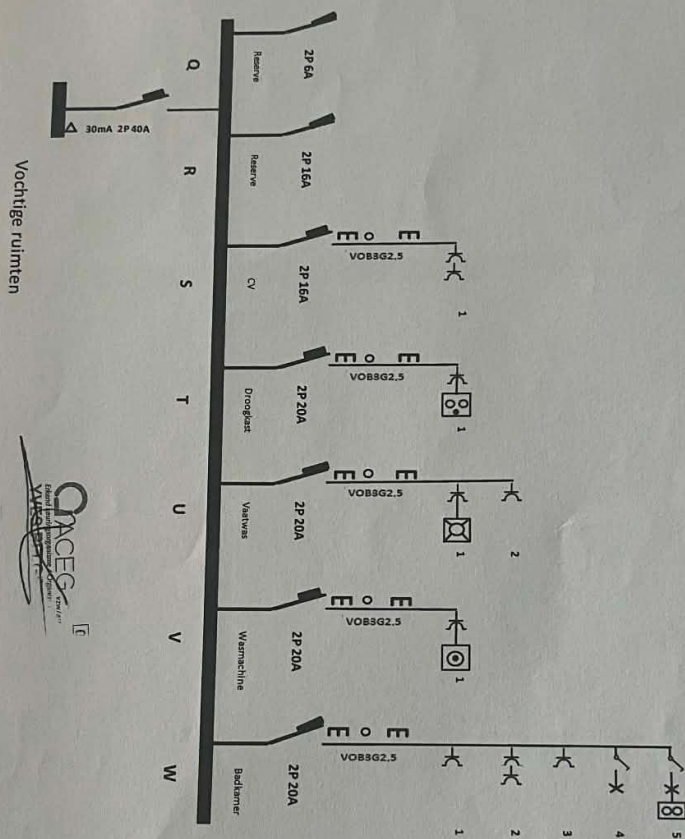

Adres van de woning Eduard Anselestraat 129
2830 Willebroek

Spanning 2 x 230V 50Hz

datum

Eigenaar Steven Delnoor

Installateur

handtekening

datum

Keuringsorganisme


handtekening

datum


KRING	SECTIE MM²	AMP	DIESCHAK	NUMMER					PLAATS	BESCHRIJVING	DETAIL
A	2,5	20	300	A1	A2	A3			LIVING LINKS	STOPK	
B	2,5	20	300	B1	B2	B3	B4		LIVING RECHTS, INKOMHALL	STOPK	VOORLAAN
C	2,5	20	300	C1	C2	C3	C4		KEUKEN RECHTS	STOPK	WERBLAD
D	2,5	20	300	D1	D2	D3	D4		KEUKEN LINKS, BERGRUIMTE	STOPK	DAMPPLAP
E	2,5	20	300	E1	E2	E3	E4		SLAAPKAMER VOOR	STOPK	MICROGOLF
F	2,5	20	300	F1	F2				SLAAPKAMER ACHTER	STOPK	
G	1,5	16	300	G1	G2	G3			INKOMHALL, TRAPHAL	VERLICHT	
H	1,5	16	300	H1	H2	H3			KEUKEN, BERGRUIMTE	VERLICHT	
I	1,5	16	300	I1					SLAAPKAMER VOOR	VERLICHT	
J	6,0	32	300	J1					KEUKEN	STOPK	OVEN
K		16							RESERVE		
L	2,5	16	300	L1	L2	L3	L4	L5	ZOLDER, SLAAPKAMER ACHTER	STOPK + VERLICHT	
M		16							RESERVE		
N	1,5	16	300	N1	N2				LIVING	VERLICHT	
O	2,5	16	300	O1	O2				TECHN RUIJITE + INKOM	STOPK	
P		20							RESERVE		
Q	1,5	6	30	Q1					VOORDEUR	VERLICHT	GEVELLAMP
R		16							RESERVE		
S	2,5	16	30	S1					BERGRUIMTE	STOPK	CV
T	2,5	20	30	T1					BERGRUIMTE	STOPK	DROOGKAST
U	2,5	20	30	U1	U2				KEUKEN	STOPK	VAATWAS
V	2,5	20	30	V1					BERGRUIMTE	STOPK	WASMACHINE
W	2,5	20	30	W1	W2	W3	W4	W5	BADKAMER	STOP + VERLICHT	

KRING	SECTIEMIN²	AMP	DIESCHAK	NUMMER					PLAATS	BESCHRIJVING	DETAIL
A	2,5	20	300	A1	A2	A3			LIVING LINKS	STOPK	
B	2,5	20	300	B1	B2	B3	B4		LIVING RECHTS, INKOMHALL	STOPK	
C	2,5	20	300	C1	C2	C3	C4		KEUKEN RECHTS	STOPK	VOORRAAN WERKBLAD
D	2,5	20	300	D1	D2	D3	D4		KEUKEN LINKS, BERGRUIMTE	STOPK	DAMPKAP MICROGOLF
E	2,5	20	300	E1	E2	E3	E4		SLAAPKAMER VOOR	STOPK	
F	2,5	20	300	F1	F2				SLAAPKAMER ACHTER	STOPK	
G	1,5	16	300	G1	G2	G3			INKOMHALL, TRAPHAL	VERLICHT	
H	1,5	16	300	H1	H2	H3			KEUKEN, BERGRUIMTE	VERLICHT	
I	1,5	16	300	I1					SLAAPKAMER VOOR	VERLICHT	
J	6,0	32	300	J1					KEUKEN	STOPK	OVEN
K		16							RESERVE		
L	2,5	16	300	L1	L2	L3	L4	L5	ZOLDER, SLAAPKAMER ACHTER	STOPK + VERLICHT	
M		16							RESERVE		
N	1,5	16	300	N1	N2				LIVING	VERLICHT	
O	2,5	16	300	O1	O2				TECHN RUIMTE + INKOM	STOPK	
P		20							RESERVE		
Q		6									
R		16							RESERVE		
S	2,5	16	30	S1					BERGRUIMTE	STOPK	CV
T	2,5	20	30	T1					BERGRUIMTE	STOPK	DROOGKAST
U	2,5	20	30	U1	U2				KEUKEN	STOPK	VAAITWAS
V	2,5	20	30	V1					BERGRUIMTE	STOPK	WASMACHINE
W	2,5	20	30	W1	W2	W3	W4	W5	BADKAMER	STOP + VERLICHT	

SCHEMA LIVING VERLICHTING

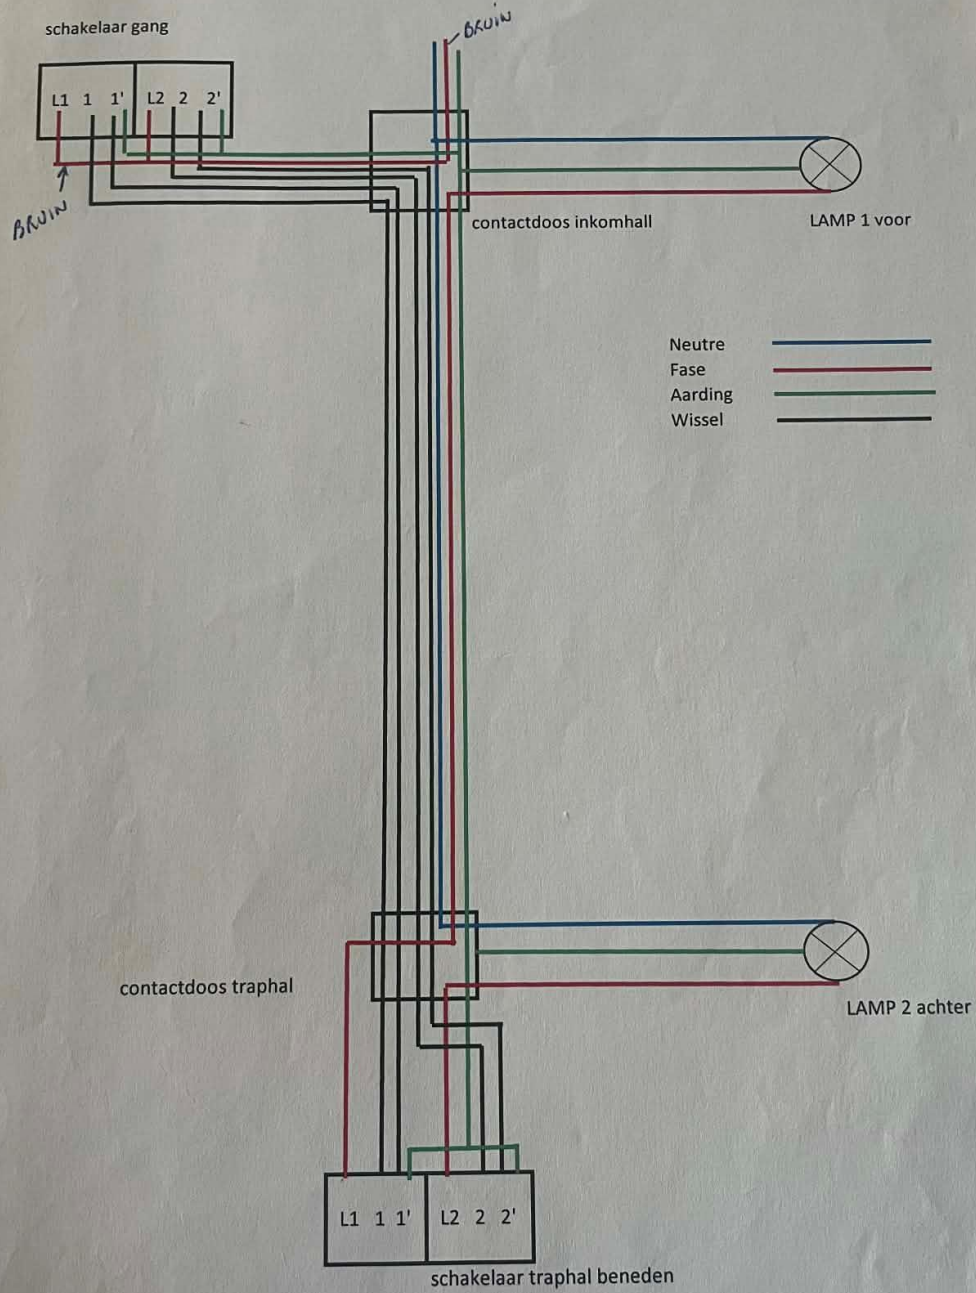


SCHEMA TRAPHAL VERLICHTING

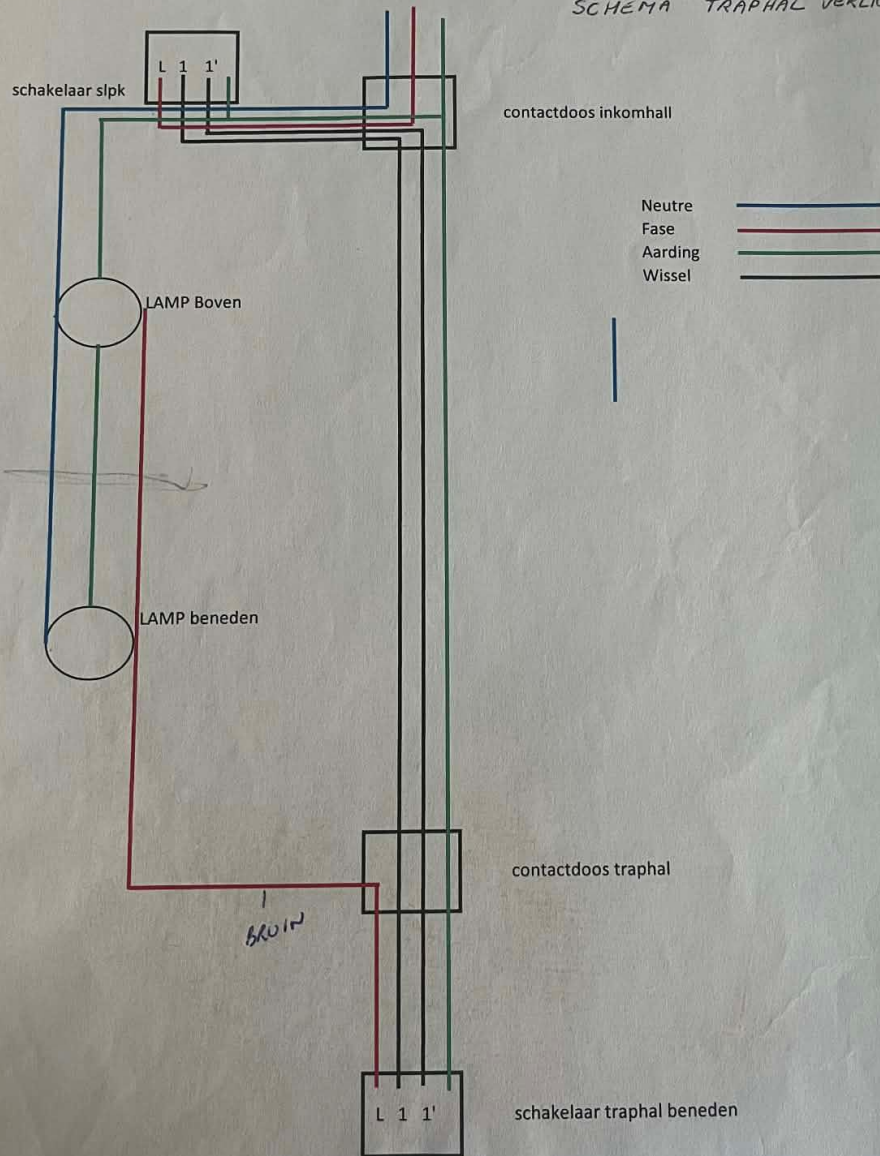

STREETWISE

BECAUSE LEADERSHIP BUILDS ON FACTS, NOT ON FICTION.

VERLICHTING KEUKEN + BERGHOK

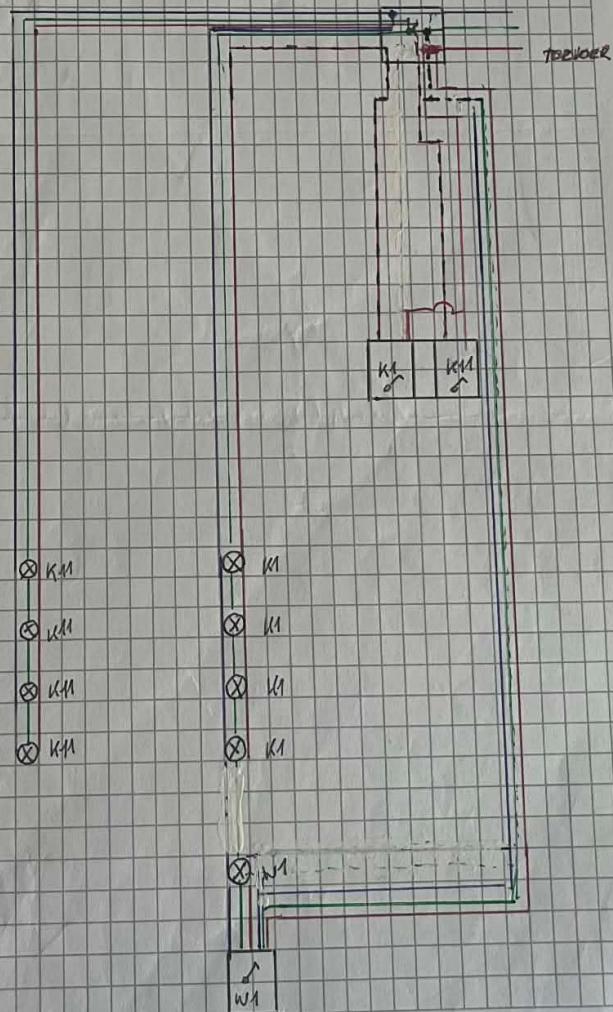

15 m f XVB 3G 2,5 m²

